

๓๐ ๒๕



เทศบาลตำบลชำช้อ
เลขที่... ๓๓๕๐
วันที่... ๒ พ.ย. ๖๙
เวลา... ๑๕.๐๗

ที่ รย ๐๐๒๒/๑๗๕๗

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๒
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งผลทดสอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชำช้อ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลชำช้อ ที่ รย ๕๕๕๐๔/๖๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๐๙๖๕ เลขที่ ๔๘๒๒๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเทศบาลตำบลชำช้อ ได้ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองทำการทดสอบความแน่นในสนาม (FIELD DENSITY TEST) จำนวน ๔ ตัวอย่าง ทำการทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (MODIFIED) จำนวน ๑ ตัวอย่าง ของงานปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล (CAPE SEAL) สายชำช้อ - ท่าข้าม หมู่ที่ ๒ ตำบลชำช้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง นั้น

บัดนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์ผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองจะรับรองผลเฉพาะจุดหรือตัวอย่างที่ทำการทดสอบเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(ชिरพงศ์ ครุฑติลกานันท์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๐๔๐-๑

สป.มท ๓๔๑๗๑

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ CAPE SEAL

สถานที่ สายช้างเผือก - พำช้าง ม. 2

สถานที่ ค.ช้างเผือก อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

ผู้ดำเนินการ หน่วยงานส่วนอำนวยการ กรมการก่อสร้าง

ชนิดตัวอย่าง ฟิล์มลูก



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองของ

COMPACTION TEST

MOD. PROCTOR

VOLUME OF MOLD = 2131 cc.
WT. OF MOLD = 4140 gm.

ทะเบียนทดสอบเลขที่ _____ ครั้งที่ 1 แผ่นที่ _____
วันที่ทดสอบ _____ วันที่พิมพ์ _____

เจ้าหน้าที่ทดสอบ.....
(นายชัชวาลย์ วัฒนศิริ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ.....
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล.....
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล.....
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)


DENSITY

DETERMINATION No.	1	2	3	4	5
WT. MOLD + COMPACTED SOIL	8614	8931	9156	9156	9031
WT. MOLD	4140	4140	4140	4140	4140
WT. SOIL	4474	4791	5016	5016	4891
WET DENSITY	2.099	2.248	2.354	2.354	2.295
DRY DENSITY	2.071	2.177	2.231	2.194	2.097

WATER CONTENT

CONTAINER No.	1	2	3	4	5
WT. CONTAINER + WET SOIL	175.30	170.50	170.40	153.20	162.00
WT. CONTAINER + DRY SOIL	173.30	165.90	162.90	144.50	150.40
WT. WATER	2.00	4.60	7.50	8.70	11.60
WT. CONTAINER	27.62	25.20	27.16	24.68	27.34
WT. DRY SOIL	145.68	140.70	135.74	119.82	123.06
WATER CONTENT	1.37	3.27	5.53	7.26	9.43

MAX. DRY DENSITY = 2.226 gm./cc.
OPT. MOISTURE CONTENT = 5.59 %

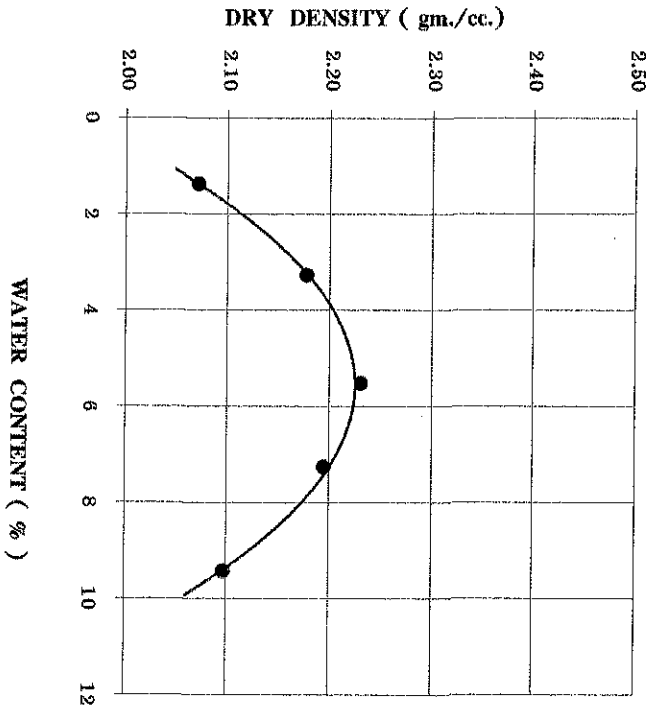

หมายเหตุ



FIELD DENSITY TEST

SAND CONE

1

PROJECT ปรับปรุงถนนลาดยาง สายชำมือ - ท่าข้าม
SECTION ม.4 ต.ชำมือ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
MATERIAL หินคลุก
LAYER -
ROAD WAY WIDTH - m. **SHOULDER WIDTH** - m.
REQUIRED PERCENT COMPACTION 95 %

ทะเบียนทดสอบเลขที่

วันที่ทดสอบ

ผู้ทดสอบ

ผู้วิเคราะห์ผล

ผู้ตรวจสอบ

นายกฤษกร แก้วปัญญา

นายสัตยา ตูละพิภาค

นายปรพล เจริญพงษ์

SAMPLE No		1	2	3	4			
STATION		-	-	-	-			
DISTANCE FROM LINE C	m.	-	-	-	-			
THICKNESS	cm.	-	-	-	-			
1	Wt.OF TRAY + SAMPLE	gm.	3232.00	3296.00	3141.00	3141.00		
2	Wt.OF TRAY	gm.	197.00	197.00	197.00	197.00		
3	Wt.OF SAMPLE	gm	3035.00	3099.00	2944.00	2944.00		
4	Wt.OF CONTAINER+FUNNEL+SAND	gm	7941.00	7931.00	7920.00	7914.00		
5	Wt.OF CONTAINER+FUNNEL+SAND REMAINING	gm	3905.00	3856.00	3894.00	3894.00		
6	Wt. OF SAND IN HOLE + FUNNEL	gm	4036.00	4075.00	4026.00	4020.00		
7	Wt. OF SAND IN FUNNEL	gm	1963.00	1963.00	1963.00	1963.00		
8	Wt. OF SAND IN HOLE	gm	2073.00	2112.00	2063.00	2057.00		
9	UNIT wt. OF TEST SAND	gm/Cm ³	1.556	1.556	1.556	1.556		
10	VOLUME OF HOLE	Cm ³	1332.26	1357.33	1325.84	1321.98		
11	WET UNIT wt OF SAMPLE	gm/Cm ³	2.278	2.283	2.220	2.227		
MOISTURE CONTENT								
12	CAN NO.		-	-	-	-		
13	Wt. CAN + WET SOIL	gm.	151.30	152.40	155.90	154.20		
14	Wt. CAN + DRY SOIL	gm.	145.20	145.90	150.80	148.30		
15	Wt. WATER	gm.	6.10	6.50	5.10	5.90		
16	Wt. CAN	gm.	25.00	25.00	25.00	25.00		
17	Wt. DRY SOIL	gm.	120.20	120.90	125.80	123.30		
18	% MOISTURE CONTENT	%	5.07	5.38	4.05	4.79		
19	DRY DENSITY OF SAMPLE =H24/(H32/100+1)	gm/Cm ³	2.168	2.167	2.134	2.125		
20	STANDARD PROCTOR DRY DENSITY	gm/Cm ³	-	-	-	-		
21	MODIFIED PROCTOR DRY DENSITY	gm/Cm ³	2.226	2.226	2.226	2.226		
22	OPTIMUM MOISTURE CONTENT	%	5.59	5.59	5.59	5.59		
23	PERCENT OF COMPACTION	%	97.40	97.33	95.87	95.47		

ผลการทดสอบรับรองเฉพาะจุดและชั้นที่ทำการทดสอบเท่านั้น

REMARK ผลทดสอบต่ำกว่าข้อกำหนดให้ทำการแก้ไขกม.ที่ ถึงกม.ที่.....

บดอัดใหม่ คราด ไถ ผสมวัสดุและบดอัด
